


# Erweiterung, Umbau und Generalsanierung des Gymnasiums Parsberg

- **Vergabe der**
  - a) **Metallfassade BA 1 – 3**
  - b) **Raffstoreanlage BA 1 – 3**
  - c) **Metallbaufassade Pfosten-Riegel BA 1 – 3**
  - d) **Düsenstrahlarbeiten BA 1**

TOP A 2

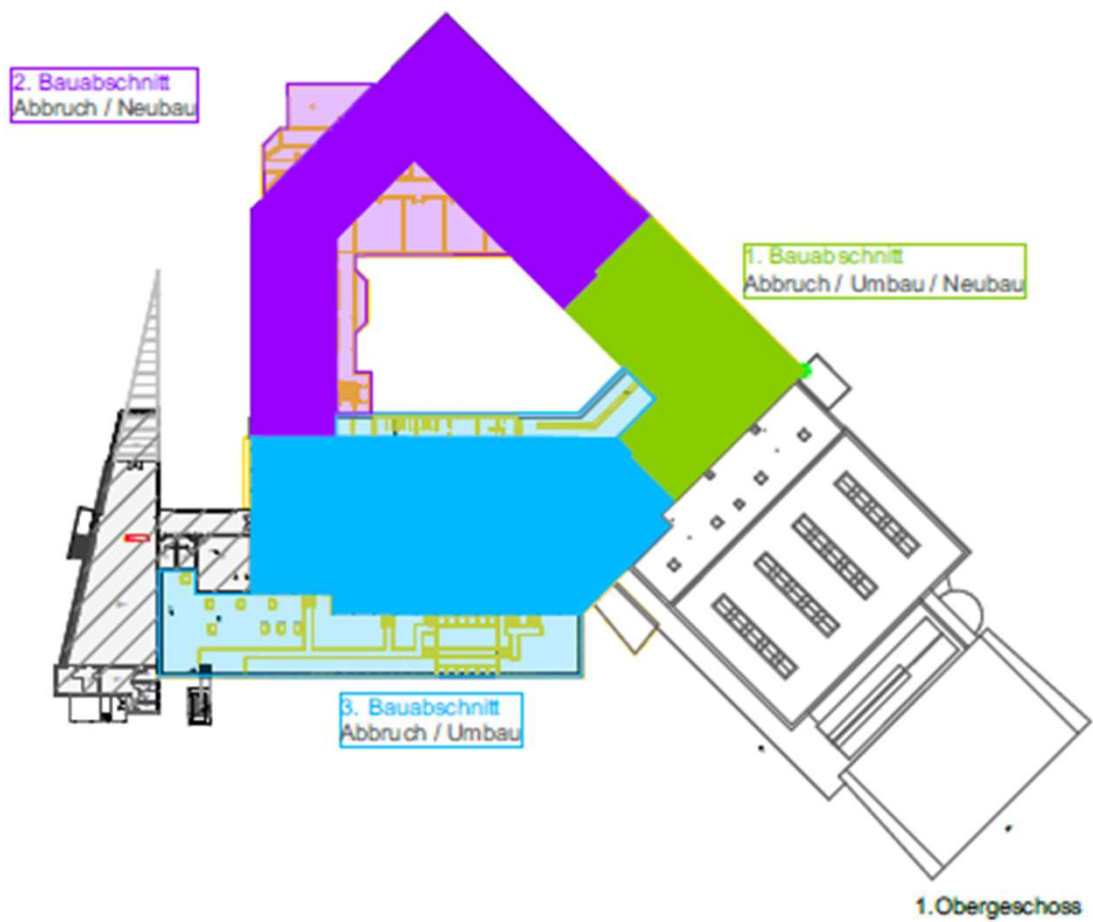

# TOP A 2



**LANDKREIS  
NEUMARKT**

|                           |              |                |        |              |
|---------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
| Vergabestand nach Paket 1 | 919.037,05 € | 1.136.642,19 € | 123,7% | 217.605,14 € |
|---------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|

| Vergabe Paket 2   |                | Submission 18.02.2021 |        |               |
|---|----------------|-----------------------|--------|---------------|
| Gewerk  | KoBer          | Submission            | %      | Differenz     |
| <b>2369 - 003 Metallfassade</b><br>Fa. Güther Sanitär GmbH, Feuchtwangen          | 877.432,22 €   | 1.162.549,22 €        | 132,5% | 285.117,00 €  |
| <b>2369 - 004 Sonnenschutzarbeiten</b><br>Fa. Kaspar Sonnenschutzsysteme, Stein   | 377.545,56 €   | 255.388,47 €          | 67,6%  | -122.157,09 € |
| <b>2369 - 098 Düsenstrahlarbeiten</b><br>Fa. Stump-Franki Spezialtiefbau, München | 227.230,50 €   | 171.692,18 €          | 75,6%  | -55.538,32 €  |
| <b>2369 - 005 Metallbau Fassade PR</b><br>Fa. Seufert-Niklaus, Bastheim           | 1.793.394,11 € | 1.538.187,63 €        | 85,8%  | -255.206,48 € |
| <b>2369 - 452 Aufzug</b><br>Fa. Kone Hannover                                     | 77.045,00 €    | 63.676,90 €           | 82,6%  | -13.368,10 €  |
| <b>2369 454 Blitzschutz</b><br>Fa. Walter, Stein                                  | 77.331,52 €    | 65.849,84 €           | 85,2%  | -11.481,68 €  |

|                                   |                       |                       |              |                      |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| <b>Differenz Paket 2 zur KoBe</b> | <b>3.429.978,91 €</b> | <b>3.257.344,24 €</b> | <b>95,0%</b> | <b>-172.634,67 €</b> |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|

|                                  |                       |                       |               |                    |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| <b>Vergabestand nach Paket 2</b> | <b>4.349.015,96 €</b> | <b>4.393.986,43 €</b> | <b>101,0%</b> | <b>44.970,47 €</b> |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
