

# **Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. -Modernisierung des Gebäudeleitsystems sowie Umgestaltung des Eingangsbereiches und Ertüchtigung Brandschutz-**

## **Beschlussfassung über die Vergabe der Metallbauarbeiten I**

- **3 Brand- und Rauchschutztüren**
- **Fluchttüren in das bestehende Treppenhaus**

# TOP 5



**BA II**  
 22.-27.KW 2018  
 = 28.05.-08.07.2018

**BA I**  
 18.-22. KW 2018  
 = 30.04.-03.06.2018



Grundriss EG Zugangsbereich

**first base**  
 seger & burnicki consulting GmbH

**BA V Fertigstellung der Außenanlagen im Eingangsbereich**  
 33.-37.KW 2018  
 =13.08.-16.09.2018

**BA IV**  
 31.-32. KW 2018  
 = 30.07.-12.08.2018


**BA III**  
 27.-32. KW 2018  
 =02.07.-12.08.2018

Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.

Modernisierung des Gebäudeleitsystems sowie Umgestaltung des Eingangsbereichs und Brandschutzerlüftung

Stand: 26.03.2018



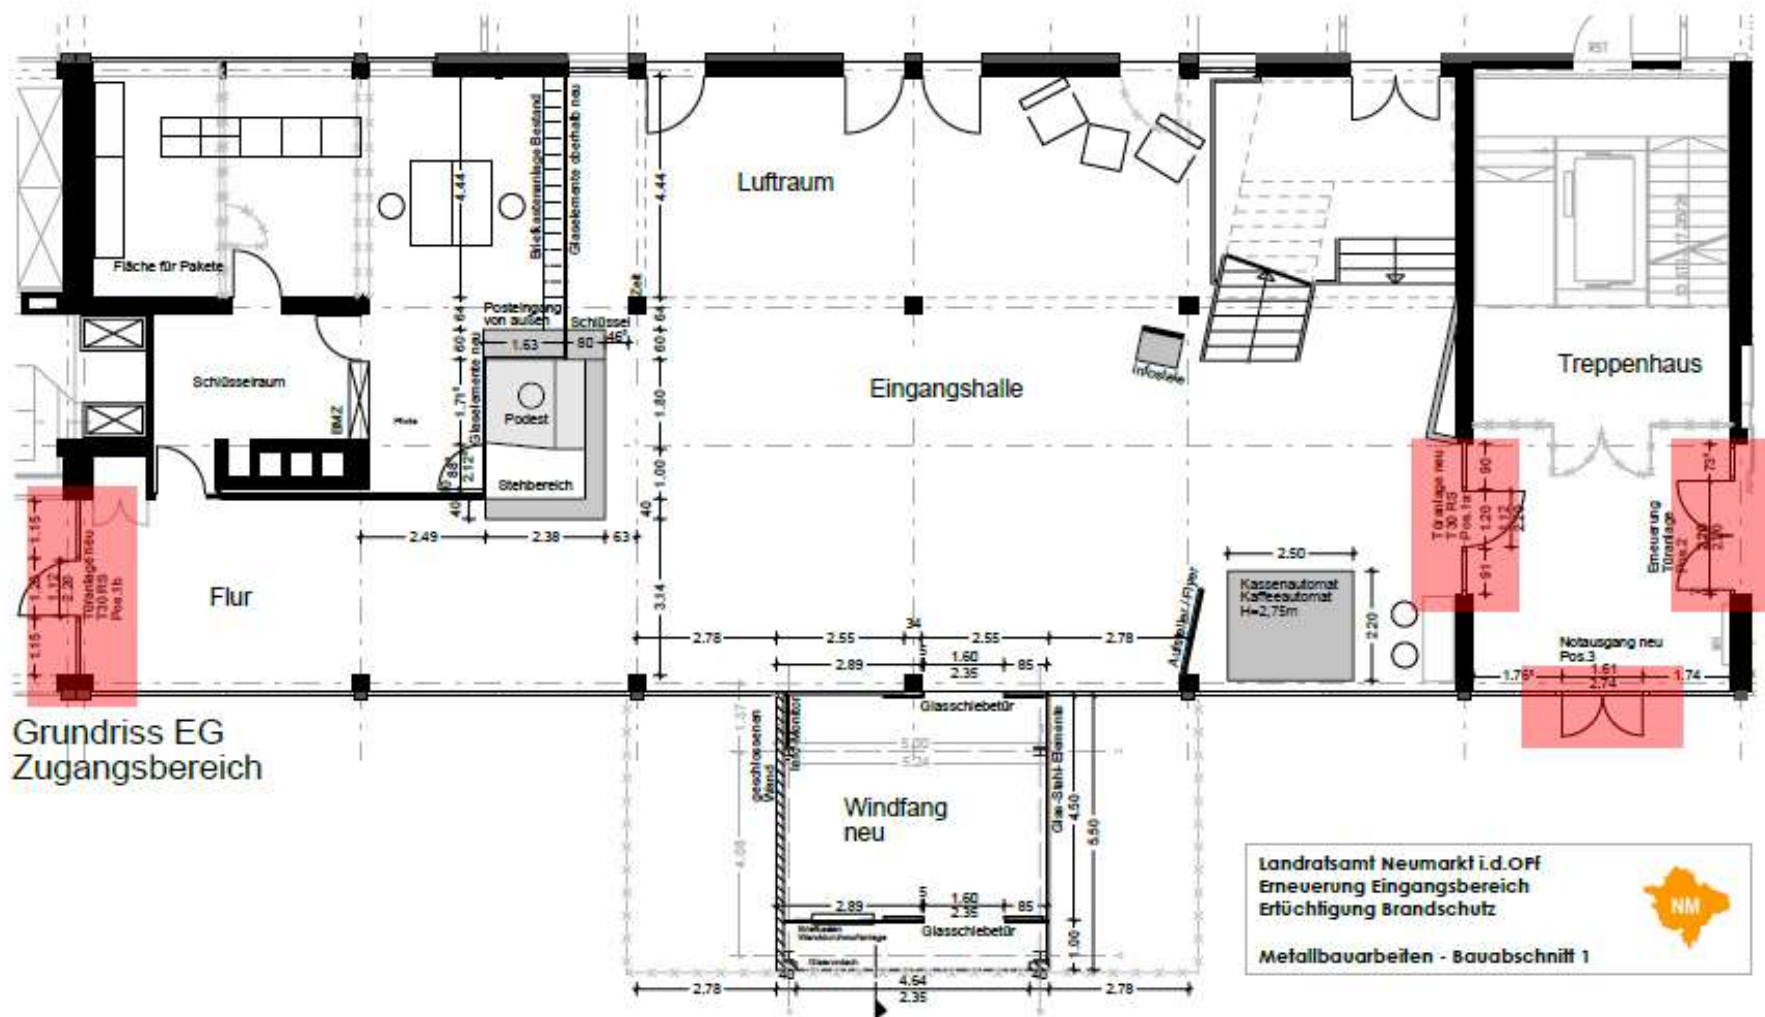



Landratsamt  
Neumarkt i.d.OPf.  
- Kreiseigener Hochbau -



Vergabevorschlag

**Landratsamt Neumarkt**  
**Modernisierung des Gebäudeleitsystems sowie Umgestaltung des Eingangsbereiches und Ertüchtigung Brandschutz**

**Gewerk:** Metallbauarbeiten I

**Vergabeart:**  öffentliche Ausschreibung  
 beschränkte Ausschreibung  
 freihändige Vergabe

**Ausschreibung vom:** 22.02.2018      angeforderte Leistungsverzeichnisse: 10

**Submission am:** 13.03.2018      eingegangene Angebote: 4

**1) Ergebnis der Angebotsprüfung**

Eignungsfeststellung: Die Eignung der Bieter wurde im Rahmen der Angebotsprüfung festgestellt.

Preisspiegel (nach rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Prüfung):

FIRMA	ANSCHRIFT	geprüfte Angebotssumme brutto	inkl. Nachlass	Rang	%	Skonto
1) Metallbau Schierer GmbH	Münchsmünster	102.626,79	0,0	1	100,0	0,0
2) Metallbau Kaiser	Pirkach	113.524,81	0,0	2	110,6	0,0
3) Metallbau Schmirler	Bergau	116.608,10	0,0	3	113,6	0,0
4) Berchthold Metallbau GmbH	Neumarkt	119.049,98	0,0	4	116,0	0,0
5) Metallbau Geppert GmbH	Neumarkt	kein Angebot				
6) Metallbau Vollmuth GmbH	Sulzbach-Rosenberg	kein Angebot				
7) Metallbau Herzog	Nürnberg	kein Angebot				
8) Metallbau Hühn	Wilhermsdorf	kein Angebot				
9) Oberland Fassadensysteme	Schwanstetten	kein Angebot				
10) Metallbau Heigl	Hemau	kein Angebot				

Die auf Rang 1 geführte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.

**2) Kostendeckung:**


laut Kostenberechnung vom 24.11.2017      104.303,50 € brutto

Mehrung / Minderung zur Kostenberechnung:      -1.676,71 € brutto (-1,6 %)

Begründung für Mehrung / Minderung ab +/- 10

TOP 5

Regensburg, den 20.03.2018

  
first base  
first base & Co. Consulting GmbH  
Albertstraße 1, 93047 Regensburg

**Beschlussvorschlag:**

Der Kreisausschuss des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. beschließt:

Auftragserteilung an Metallbau Schierer GmbH  
Gewerbegebiet Süd 2  
85126 Münchsmünster

Neumarkt i.d.OPf., 21.03.2018

  
Maderer

über Abteilung 10  
Hr. Ried

Herrn  
Landrat Gailler

mit der Bitte um Kenntnisnahme und Behandlung in der Sitzung des Kreisausschusses am  
26.03.2018.

  
22.03.2018



LANDKREIS  
NEUMARKT

Kreisausschuss

Beschlussvorschlag:

**Der Kreisausschuss des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. stimmt der Vergabe der Metallbauarbeiten 1 beim Bauvorhaben Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. an die Firma Metallbau Schiererer GmbH, 85126 Münchsmünster zu.**
